


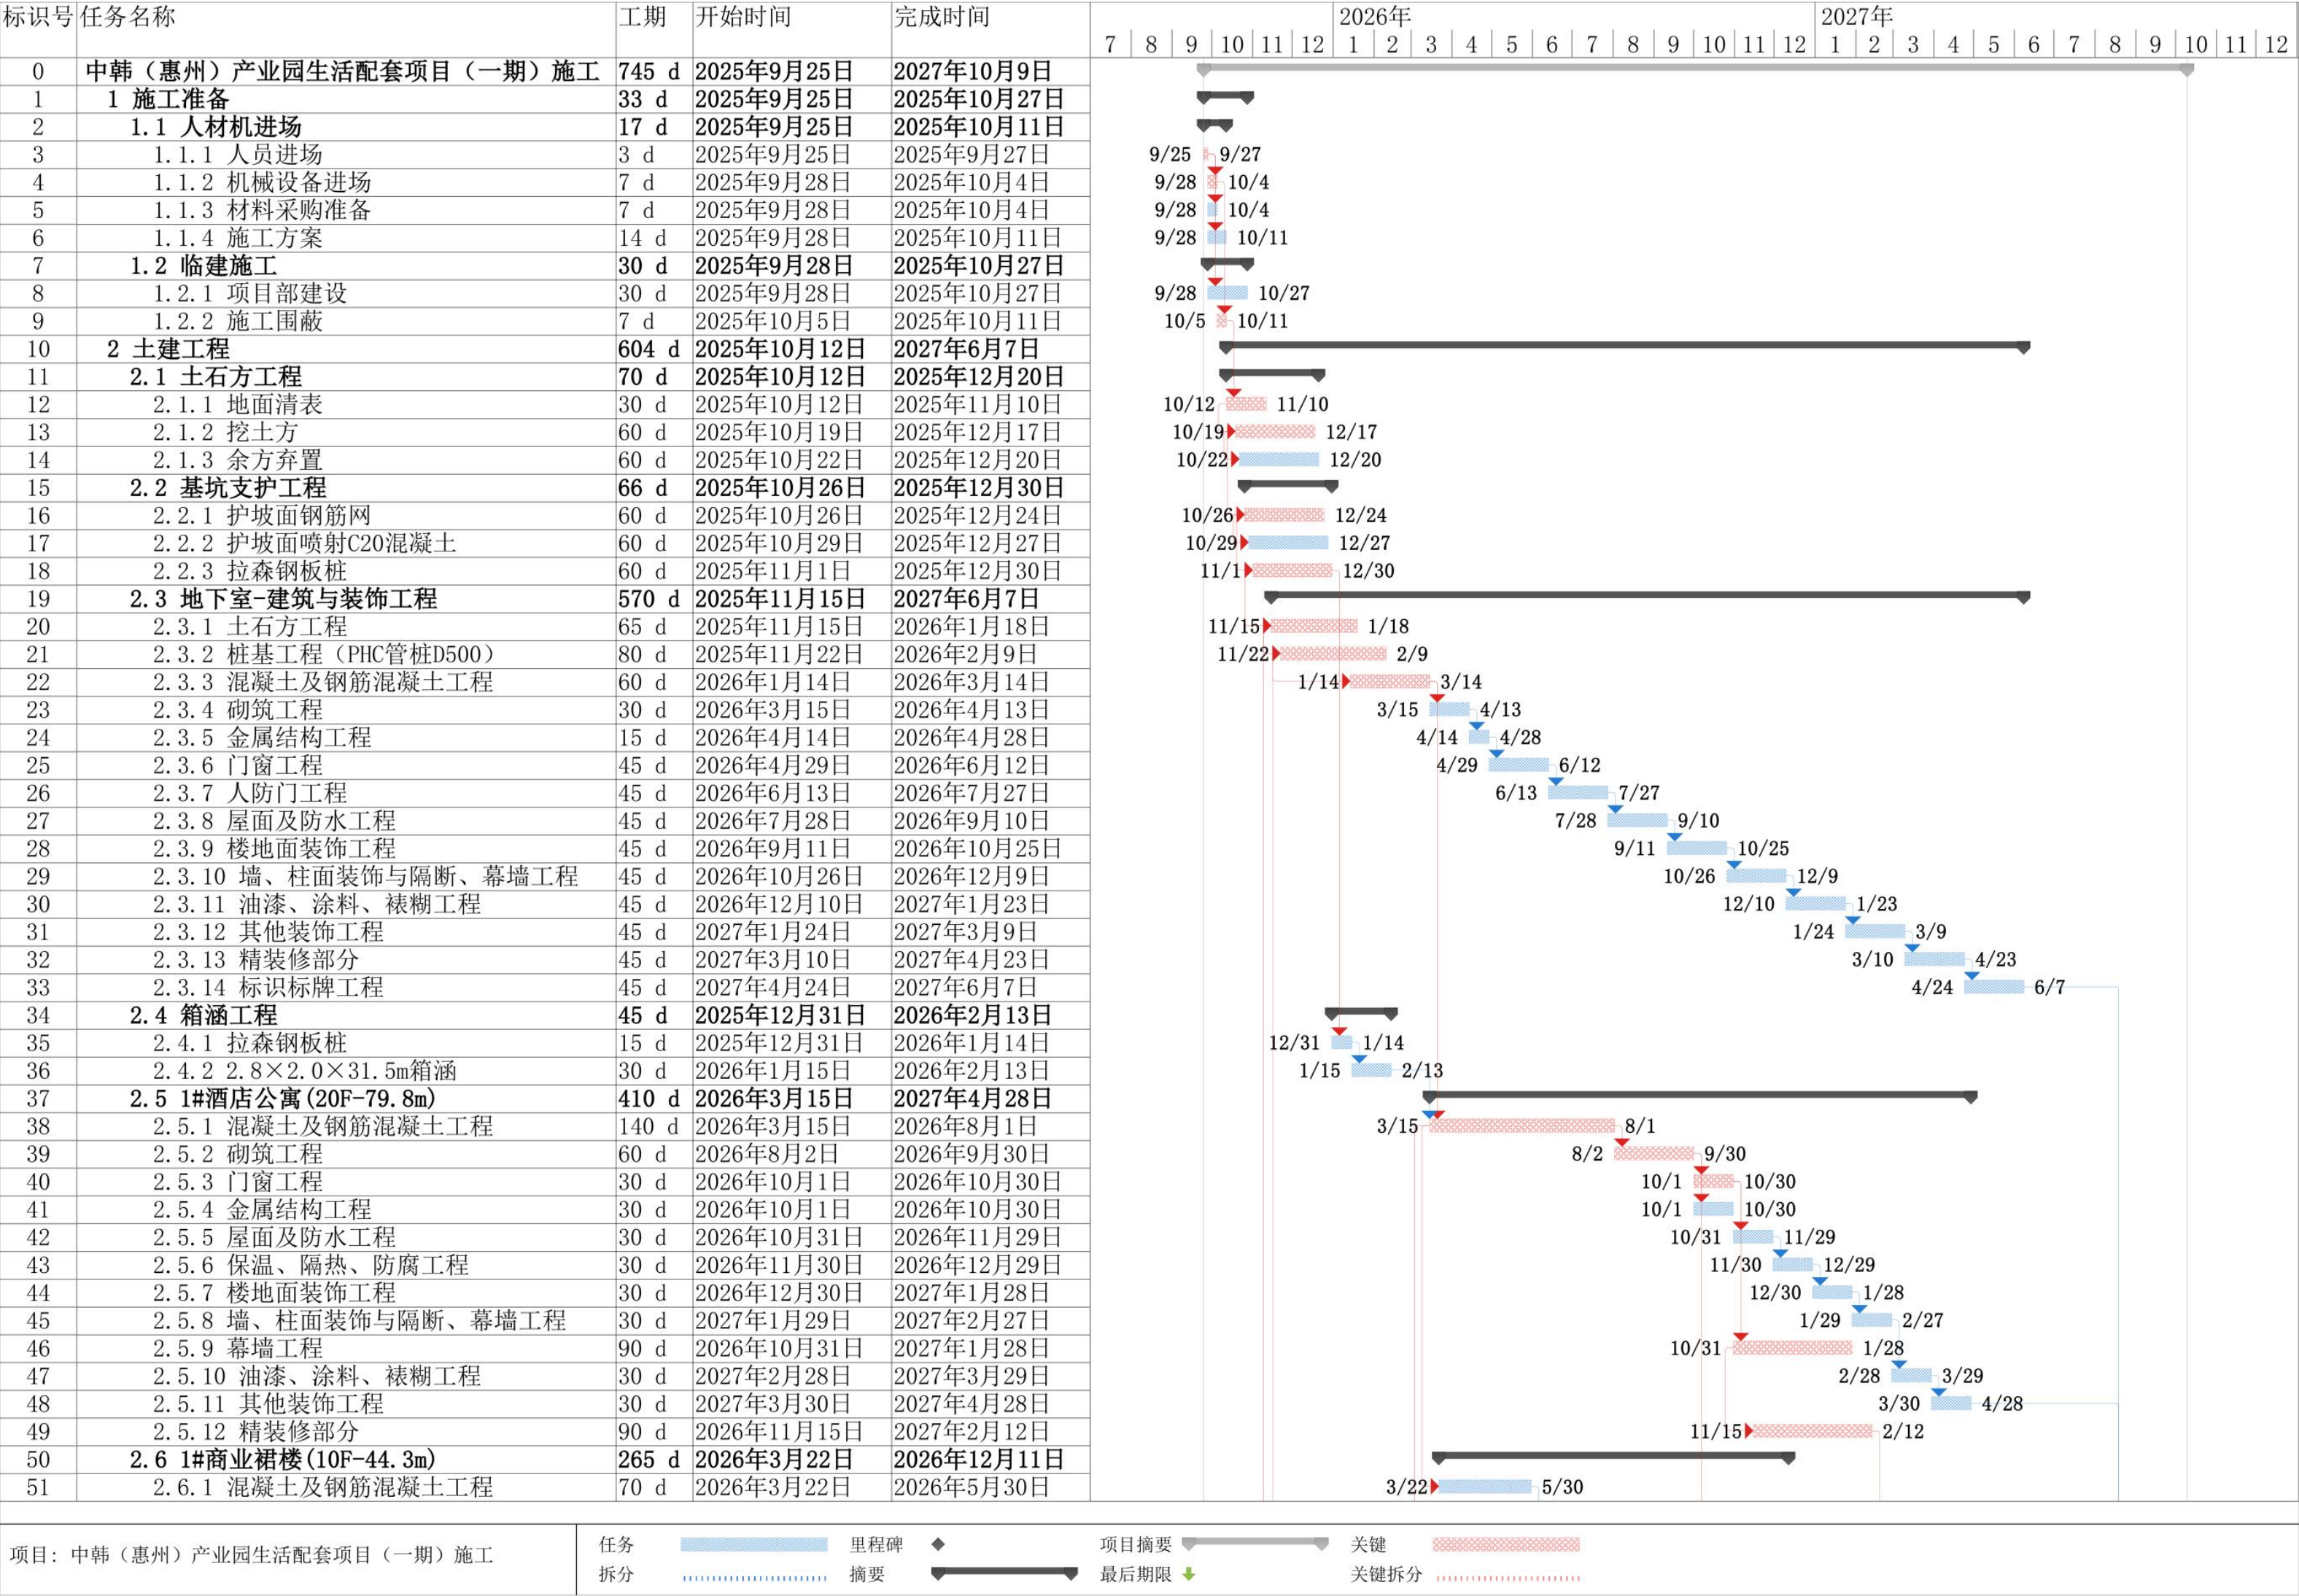

[illegible]

| 标识号 | 任务名称                   | 工期    | 开始时间       | 完成时间        | 2026年 |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   | 2027年 |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|------------------------|-------|------------|-------------|-------|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|     |                        |       |            |             | 7     | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7     | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 104 | 2.9.12 油漆、涂料、裱糊工程      | 15 d  | 2026年6月13日 | 2026年6月27日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 105 | 2.9.13 幕墙工程            | 30 d  | 2026年6月28日 | 2026年7月27日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 106 | 2.9.14 其他装饰工程          | 7 d   | 2026年7月28日 | 2026年8月3日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 107 | 2.10 5#商业(2F-11.50m)   | 215 d | 2026年1月14日 | 2026年8月16日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 108 | 2.10.1 土石方工程           | 4 d   | 2026年1月14日 | 2026年1月17日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 109 | 2.10.2 桩基工程（PHC管桩D500） | 5 d   | 2026年1月24日 | 2026年1月28日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 110 | 2.10.3 混凝土及钢筋混凝土工程     | 20 d  | 2026年1月29日 | 2026年2月17日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 111 | 2.10.4 砌筑工程            | 15 d  | 2026年2月18日 | 2026年3月4日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 112 | 2.10.5 金属结构工程          | 15 d  | 2026年3月5日  | 2026年3月19日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 113 | 2.10.6 门窗工程            | 15 d  | 2026年3月20日 | 2026年4月3日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 114 | 2.10.7 屋面及防水工程         | 15 d  | 2026年4月4日  | 2026年4月18日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 115 | 2.10.8 保温、隔热、防腐工程      | 15 d  | 2026年4月19日 | 2026年5月3日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 116 | 2.10.9 楼地面装饰工程         | 15 d  | 2026年5月4日  | 2026年5月18日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 117 | 2.10.10 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 15 d  | 2026年5月19日 | 2026年6月2日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 118 | 2.10.11 天棚工程           | 15 d  | 2026年6月3日  | 2026年6月17日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 119 | 2.10.12 油漆、涂料、裱糊工程     | 15 d  | 2026年6月18日 | 2026年7月2日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 120 | 2.10.13 其他装饰工程         | 15 d  | 2026年7月3日  | 2026年7月17日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 121 | 2.10.14 幕墙工程           | 30 d  | 2026年7月18日 | 2026年8月16日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 122 | 2.11 6#商业(2F-11.50m)   | 231 d | 2026年1月18日 | 2026年9月5日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 123 | 2.11.1 土石方工程           | 4 d   | 2026年1月18日 | 2026年1月21日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 124 | 2.11.2 桩基工程（PHC管桩D500） | 5 d   | 2026年1月29日 | 2026年2月2日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 125 | 2.11.3 混凝土及钢筋混凝土工程     | 20 d  | 2026年2月3日  | 2026年2月22日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 126 | 2.11.4 砌筑工程            | 15 d  | 2026年2月23日 | 2026年3月9日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 127 | 2.11.5 金属结构工程          | 15 d  | 2026年3月10日 | 2026年3月24日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 128 | 2.11.6 门窗工程            | 15 d  | 2026年3月25日 | 2026年4月8日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 129 | 2.11.7 屋面及防水工程         | 15 d  | 2026年4月9日  | 2026年4月23日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 130 | 2.11.8 保温、隔热、防腐工程      | 15 d  | 2026年4月24日 | 2026年5月8日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 131 | 2.11.9 楼地面装饰工程         | 15 d  | 2026年5月9日  | 2026年5月23日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 132 | 2.11.10 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 15 d  | 2026年5月24日 | 2026年6月7日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 133 | 2.11.11 天棚工程           | 15 d  | 2026年6月8日  | 2026年6月22日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 134 | 2.11.12 油漆、涂料、裱糊工程     | 15 d  | 2026年6月23日 | 2026年7月7日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 135 | 2.11.13 其他装饰工程         | 15 d  | 2026年7月8日  | 2026年7月22日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 136 | 2.11.14 幕墙工程           | 45 d  | 2026年7月23日 | 2026年9月5日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 137 | 2.12 7#商业(2F-11.50m)   | 201 d | 2026年1月22日 | 2026年8月10日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 138 | 2.12.1 土石方工程           | 1 d   | 2026年1月22日 | 2026年1月22日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 139 | 2.12.2 混凝土及钢筋混凝土工程     | 20 d  | 2026年1月23日 | 2026年2月11日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 140 | 2.12.3 砌筑工程            | 15 d  | 2026年2月12日 | 2026年2月26日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 141 | 2.12.4 金属结构工程          | 15 d  | 2026年2月27日 | 2026年3月13日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 142 | 2.12.5 门窗工程            | 15 d  | 2026年3月14日 | 2026年3月28日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 143 | 2.12.6 屋面及防水工程         | 15 d  | 2026年3月29日 | 2026年4月12日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 144 | 2.12.7 保温、隔热、防腐工程      | 15 d  | 2026年4月13日 | 2026年4月27日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 145 | 2.12.8 楼地面装饰工程         | 15 d  | 2026年4月28日 | 2026年5月12日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 146 | 2.12.9 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程  | 15 d  | 2026年5月13日 | 2026年5月27日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 147 | 2.12.10 天棚工程           | 15 d  | 2026年5月28日 | 2026年6月11日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 148 | 2.12.11 油漆、涂料、裱糊工程     | 15 d  | 2026年6月12日 | 2026年6月26日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 149 | 2.12.12 幕墙工程           | 30 d  | 2026年6月27日 | 2026年7月26日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 150 | 2.12.13 其他装饰工程         | 15 d  | 2026年7月27日 | 2026年8月10日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 151 | 3 电气工程                 | 270 d | 2026年5月4日  | 2027年1月28日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 152 | 3.1 地下室、2#-7#商业楼       | 162 d | 2026年5月4日  | 2026年10月12日 |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 153 | 3.2 1#酒店公寓             | 120 d | 2026年10月1日 | 2027年1月28日  |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 154 | 4 给排水工程                | 272 d | 2026年7月8日  | 2027年4月5日   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 155 | 4.1 地下室、2#-7#商业楼       | 140 d | 2026年7月8日  | 2026年11月24日 |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

项目：中韩（惠州）产业园生活配套项目（一期）施工

任务

里程碑

项目摘要

关键

拆分

摘要

最后期限

关键拆分

[illegible]
